



Neubau SCHILTHORNBAHN 20XX

Information Nr. 8 . Juli - Dezember 2024

Gepäcktransporte bis Freitag, 13. Dezember 2024

Der Engpass geht bald zu Ende!

Während der Bauarbeiten an der 1. Sektion Stechelberg – Mürren ist die Kapazität auf der Luftseilbahn Stechelberg – Gimmelwald – Mürren bis am 13. Dezember 2024 nach wie vor begrenzt.

Limitierte Gepäcktransporte:

- Maximal 3 silberne Gepäckwagen pro Fahrt.
- Unterteilung der Gepäckwagen in zwei Abteile, resp. für zwei Parteien, möglich.

Zusatzinformationen:

- **Warenlift in Stechelberg:** Beförderung von Gepäckwagen zwischen Perron und Parkplatz.
- **Bedienung des Warenlifts** durch Personal der Schilthornbahn.
- **Paraglider-Gruppen:** Stapelung der Gleitschirme in silbernen Gepäckwagen oder platzsparende Verwahrung in einer Ecke der Kabine.

Versorgung Mürren/Gimmelwald während Revisionen der Schilthornbahn und BLM

Während den Revisionen der Schilthornbahn und der BLM kommt es im Herbst 2024 letztmals zu Einschränkungen im Güterverkehr. Der Personentransport ist jederzeit via Schilthornbahn oder BLM, uneingeschränkt sichergestellt.

Revision Schilthornbahn 18. November bis 29. November 2024 (Strecke Stechelberg – Gimmelwald – Mürren)

- keinen Einfluss auf den Güterverkehr
- Personenverkehr via BLM
- Im **Halbstundentakt** fährt ein Shuttlebus zwischen Gimmelwald und der Station BLM Mürren (zusätzliche Haltestelle Sportchalet).

Betriebsunterbruch BLM 21. Oktober bis 8. November 2024

Der Transport der Alltagsgüter (Lebensmittel) ist mit der Schilthornbahn sichergestellt und wie folgt möglich:

- Morgens ab 05:55 Uhr bis spätestens 08:25 Uhr
- Abends jeweils ab 16:55 Uhr

Dazwischen sind keine Gütertransporte möglich, nur Personen- und Gepäcktransporte.



Fahrplan-Erweiterung

Strecke Stechelberg-Mürren

Sommersaison (bis 13. Oktober 2024):

Die Luftseilbahn fährt zwischen 7.55 Uhr bis 17.55 Uhr täglich im 15-Minuten-Takt. Ausserhalb dieser Zeit gilt der offizielle Fahrplan.

Herbstsaison (14. Oktober bis 13. Dezember 2024):

Die Luftseilbahn fährt zwischen 8.55 Uhr bis 16.55 Uhr täglich im 15-Minuten-Takt. Ausserhalb dieser Zeit gilt der offizielle Fahrplan.



Station Stechelberg (Foto 29.06.2024 / Bruno Petroni)

Stechelberg

Bauprogramm Juli 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Baumeisterarbeiten Frutiger AG, Thun

15.07. – 09.08.2024	Einfahrtspur Parkplatz und Neubau Barrierenanlage
19.08. – 11.10.2024	Buswendeschleife und Haltestelle Postauto
09.09. – 04.10.2024	Begrünung, Bepflanzung, Ausstattung Postautohaltestelle, Künzli Gartengestaltung, Interlaken

Innenausbau

17.06. – 09.08.2024	Innenausbau Kasse, Büros, Holzcreation Schmid, Grindelwald
29.07. – 09.08.2024	Montage Sanitärapparate, Kolb & Walther AG, Mürren
29.07. – 16.08.2024	Montage Innenbeleuchtungen, Lichtform AG, Wilderswil
19.08. – 11.10.2024	Ersatz Warenlift (Bestand, alte Station), Schindler AG, Ebikon
02.09. – 13.09.2024	Montage Signaletik, Beschriftungswerk, Bern
02.09. – 13.09.2024	Montage Kassenmöbel und Verglasungen, Holzcreation Schmid, Grindelwald
09.09. – 20.09.2024	Einbau Bodenbeläge, Kolb Wohnideen, Unterseen

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG

07.06. – 02.08.2024	Montage Güterlogistik
14.06. – 16.08.2024	Seilzug Luftseilbahn ATW Sektion 1 Stechelberg – Mürren
August 2024	Montage Kabinen, Laufwerke und Gehänge
30.08. – 08.11.2024	Inbetriebnahme und Probetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Luftseilbahn ATW Stechelberg – Mürren > Freitag, 13.12.2024



Station Mürren (Foto 29.06.2024 / Bruno Petroni)

Mürren (Bergstation Stechelberg – Mürren)

Bauprogramm Juli 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Baumeisterarbeiten ARGE 007 Gerber + Troxler AG, Interlaken / Gasser Felstechnik AG, Lungern

17.06. – 23.08.2024 Absenkung Strasse Station - Mürrenbach
bis 19.07.2024 Ende der Rohbauarbeiten

Innenausbau

17.06. – 05.07.2024	Leitungsbau HLS, Heizung, Marcel Fischer, Grindelwald
17.06. – 05.07.2024	Elektroinstallationen, Leitungstrassen, Elektro Hunziker AG, Thun
19.06. – 20.09.2024	Innenausbau Kasse, Büros, Holzkeation Schmid, Grindelwald
16.07. – 28.07.2024	Montage Personenlift, Schindler AG, Ebikon
16.09. – 20.09.2024	Einbau Bodenbeläge, Kolb Wohnideen, Unterseen
23.09. – 11.10.2024	Montage Signaletik, Beschriftungswerk, Bern
23.09. – 11.10.2024	Ausstattungen, Fertigstellung Elektroinstallationen und IT, Elektro Hunziker AG, Thun
23.10. – 15.11.2024	Fertigstellung Ausbau Stationen Mürren

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Luftseilbahn ATW Stechelberg – Mürren)

14.06. – 16.08.2024	Montage Seilbahn-Steuerung, Frey AG, Stans
14.06. – 16.08.2024	Seilzug Stechelberg – Mürren
August 2024	Montage Kabinen, Laufwerke und Gehänge
30.08. – 08.11.2024	Inbetriebnahme und Probetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Luftseilbahn ATW Stechelberg – Mürren > Freitag, 13.12.2024



Station Mürren (Foto 29.06.2024 / Bruno Petroni)

Mürren (Talstation Mürren – Birg)

Bauprogramm Juli 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Baumeisterarbeiten ARGE 007 Gerber + Troxler AG, Interlaken / Gasser Felstechnik AG, Lungern

17.06. – 23.08.2024	Absenkung Strasse Station - Mürrenbach
bis 19.07.2024	Ende der Rohbauarbeiten

Aufrichte Holz- und Stahlbau, Brawand Zimmerei AG, Grindelwald

15.07. – 26.07.2024	Aufrichte Fingerdocks EG
29.07. – 09.08.2024	Aufrichte Zwischenbau
29.07. – 30.08.2024	Fassadenverkleidungen Kupferblech, Indubau AG, Gunzgen SO
29.07. – 30.08.2024	Verglasung Fingerdocks, Montage Schiebetüren, AMM Künzli, Thun

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Mürren - Birg)

24.05. – 02.08.2024	Montage Antrieb FUF Spur 2.1 links und 2.2 rechts
23.07. – 27.07.2024	Anlieferung der Tragseile nach und durch Mürren
29.07. – 18.10.2024	Seilzug Spur 2.2 rechts Mürren – Birg
02.08. – 23.08.2024	Montage Stahlbau, Seilschuhe, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste
09.08. – 27.09.2024	Montage Seilbahn-Steuerung, Frey AG, Stans
September 2024	Anlieferung und Montage Kabine
18.10. – 13.12.2024	Inbetriebnahme und Probetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Funifor FUF Spur 2.2 rechts Mürren – Birg > Freitag, 13.12.2024



Bergstation Birg (Foto 04.06.2024 / Bruno Petroni)

Birg (Bergstation Mürren – Birg)

Bauprogramm Juli 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Aufrichte Holz- und Stahlbau Brawand Zimmerei AG, Grindelwald

14.10. – 18.10.2024	Aufrichte Korridor Mitteltrakt
20.10. – 01.11.2024	Verglasung Korridor Mitteltrakt, AMM Künzli, Thun

Innenausbau

17.06. – 19.07.2024	Roh- und Ausbau Kommandoraum Sektion 2
22.07. – 23.08.2024	Montage Innenausbauten
05.08. – 16.08.2024	Einbau Hartbetonboden, Luchs Bodenbeläge AG, Hofstetten b. Brienz
16.09. – 27.09.2024	Ausstattungen, Fertigstellung Elektroinstallationen und IT, Elektro Brunner AG, Interlaken
23.09. – 27.09.2024	Montage Signaletik, Beschriftungswerk, Bern
30.09. – 04.10.2024	Einbau Bodenbeläge, Kolb Wohnideen, Unterseen
14.10. – 01.11.2024	Einbau Provisorium Souvenir Shop Birg
14.10. – 15.11.2024	Einbau Pop-Up Restaurant «Dock 1»

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Mürren – Birg)

09.08. – 27.09.2024	Montage Seilbahn-Steuerung, Frey AG, Stans
29.07. – 18.10.2024	Seilzug Spur 2.2 rechts Mürren – Birg
18.10. – 13.12.2024	Inbetriebnahme und Probetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Funifor FUF Spur 2.2 rechts Mürren – Birg > Freitag, 13.12.2024



Talstation Birg (Foto 26.06.2024 / Bruno Petroni)

Birg (Talstation Birg – Schilthorn)

Bauprogramm Juli 2024 bis Eröffnung März 2025

Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen

07.07.2024 Rohbauende Baumeister

Aufrichte Holz- und Stahlbau Brawand Zimmerei AG, Grindelwald

04.07. – 12.07.2024 Aufrichte Fingerdocks Talstation

14.10. – 18.10.2024 Aufrichte Korridor Mitteltrakt

20.10. – 01.11.2024 Verglasung Korridor Mitteltrakt, AMM Künzli, Thun

Fassaden- und Flachdacharbeiten Fingerdocks EG

22.07. – 23.08.2024 Spenglerarbeiten Fassade Fingerdocks 1. OG, Indubau AG, Gunzgen SO

22.07. – 23.08.2024 Flachdacharbeiten Fingerdocks 1. OG, Kämpfer AG, Herzogenbuchsee

Innenausbau

Ab 27.09.2024 Innenausbau Talstation Birg

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Birg – Schilthorn)

12.07. – 16.08.2024 Montage Antrieb

16.08. – 06.09.2024 Montage Stahlbau, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste

04.10. – 20.12.2024 Montage Seilbahn-Steuerung, Frey AG, Stans

Betriebseinstellung und Demontage Luftseilbahn Birg – Schilthorn > Sonntag, 13.10.2024 (abends)

14.10. – 25.10.2024 Rückbau/Demontage alte Luftseilbahn Birg - Schilthorn

28.10. – 24.01.2025 Seilzug Funifor Spur 3.1 links Birg – Schilthorn

Januar 2025 Anlieferung und Montage Kabine

24.01. – 14.03.2025 Inbetriebnahme und Probetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Funifor FUF Spur 3.1 links Birg – Schilthorn > Samstag, 15.03.2025



Gipfelgebäude Schilthorn – Piz Gloria (Foto 04.06.2024 / Bruno Petroni)

Schilthorn – Piz Gloria

Bauprogramm Juli 2024 bis Eröffnung März 2025

Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen

15.04. – 26.07.2024	Betonarbeiten Pollerwände Level -4, Rückwände Level -4, Y-Stütze und Perrondecke
01.07. – 02.08.2024	Aushub und Betonarbeiten Fundationsschacht 3.2
28.06. – 15.11.2024	Bauphase 24.3 Betonarbeiten Oktagon rund um Terrasse bis Level -2

Innenausbau

15.07. – 20.07.2024	Einbringung erste Rolltreppen Level -3/-2, Schindler AG, Ebikon
---------------------	---

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Birg – Schilthorn)

06.09. – 11.10.2024	Montage Stahlbau, Seilschuhe, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste
04.10. – 20.12.2024	Montage Seilbahn-Steuerung, Frey AG, Stans

Betriebseinstellung und Demontage Luftseilbahn Birg – Schilthorn > Sonntag, 13.10.2024 (abends)

Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen

18.11. – 14.03.2025	Bauphase 24.3 Betonarbeiten Oktagon Level -1 bis 0
15.10. – 07.11.2025	Bauphase 24.4 Rückbau Abfangungen und Kabinenführungen Luftseilbahn
30.10. – 10.03.2025	Bauphase 24.5 Neubau Mittelfingerdock Teil 1, Fachwerke, Abstützung Fingerdock
11.03. – 11.04.2025	Bauphase 25.1 Abbruch Perron rechts, Abbruch Spannschacht

Innenausbau


Ab 27.09.2024	Innenausbau Talstation Birg
---------------	-----------------------------

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Birg – Schilthorn)

14.10. – 25.10.2024	Rückbau/Demontage alte Luftseilbahn Birg - Schilthorn
28.10. – 24.01.2025	Seilzug Funifor Spur 3.1 links Birg – Schilthorn
Januar 2025	Anlieferung und Montage Kabine
24.01. – 14.03.2025	Inbetriebnahme und Probetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Funifor FUF Spur 3.1 links Birg – Schilthorn > Samstag, 15.03.2025

Baustellen-Besichtigung

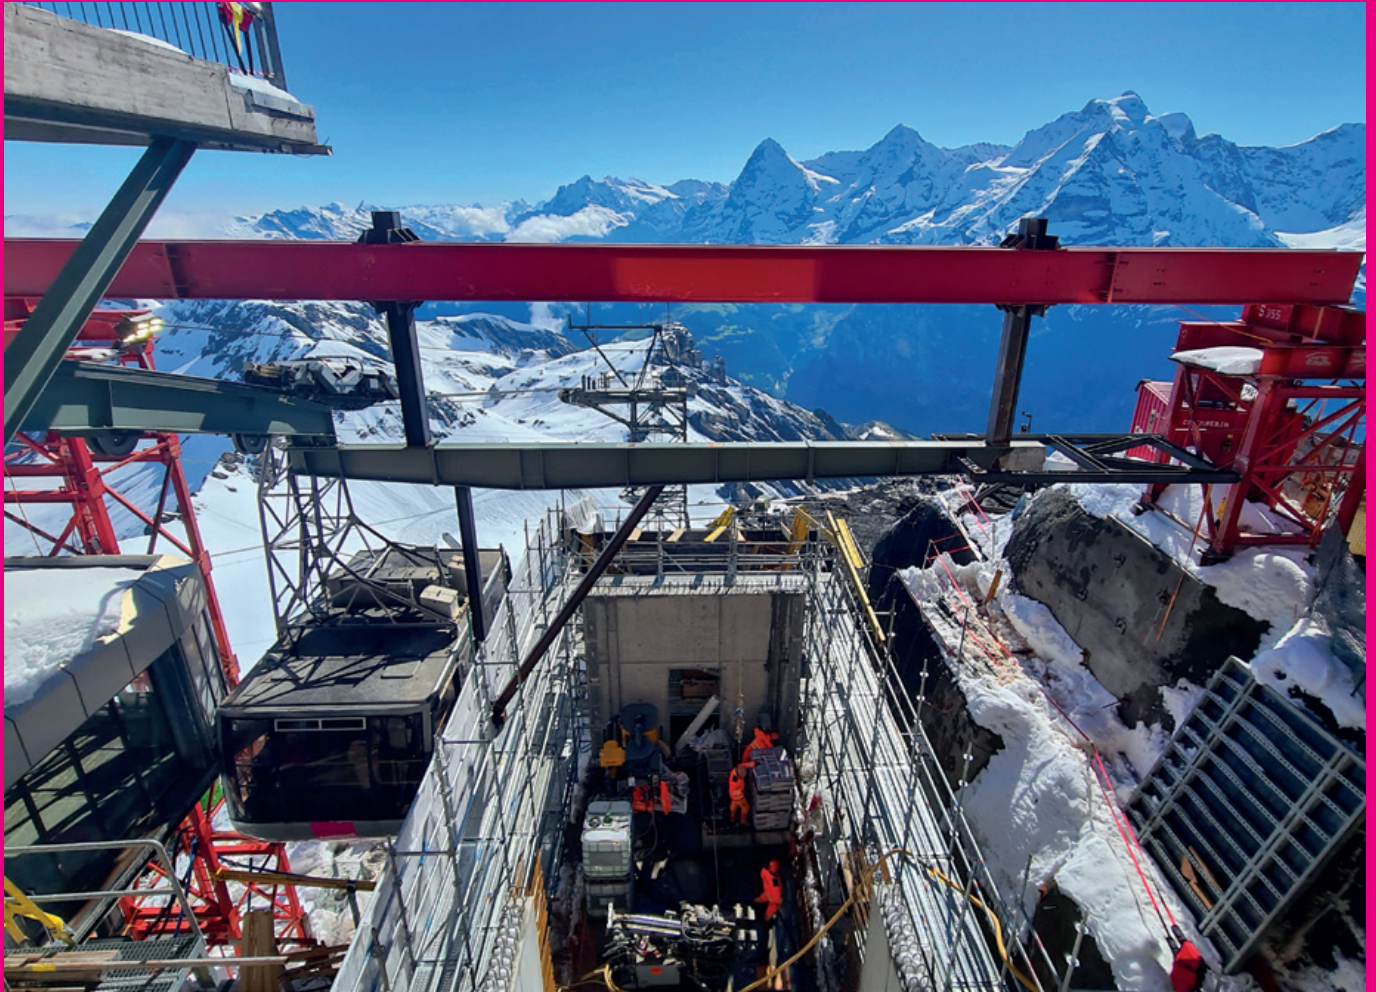

Neugierig wie das Jahrhundertprojekt SCHILTHORNBahn 20XX entsteht?

Lassen Sie sich von den einmaligen Hochgebirgsbaustellen bis auf 2970 m beeindrucken! Während dem Rundgang über unsere Baustellen in Stechelberg, Mürren, Birg und Schilthorn gibt es viele Hintergrundinformationen rund um die Bauarbeiten zu erfahren.

Erleben Sie die Faszination des Hochgebirgsbaus hautnah:

- Samstag, 24. August 2024
- Samstag, 31. August 2024
- Samstag, 14. September 2024
- Samstag, 21. September 2024
- Samstag, 28. September 2024

Der Rundgang startet jeweils um 13:15 Uhr bei der Station Stechelberg und dauert ca. 3 Stunden. Wir empfehlen festes, trittsicheres Schuhwerk und warme, wetterfeste Kleidung.

Teilnahme ist kostenlos. Ticket für die Luftseilbahn muss jede/r Teilnehmer/in selber lösen.

Eine Anmeldung ist notwendig: T. 033 856 21 50 / info@schilthorn.ch



Webcams

Der Fortschritt der Bauarbeiten kann auch via Webcams auf folgender Webseite verfolgt werden:

www.schilthornbahn20xx.ch

Schilthornbahn AG
Lengwald 301, 3824 Stechelberg
T +41 (0)33 82 60 007 . info@schilthorn.ch

www.schilthornbahn20xx.ch
